

**RELAZIONE TECNICA IN RISCONTRO AL
VERBALE DI SOPRALLUOGO ARPAC N° 18/RO/19 DEL 06.06.2019
- COLLAUDO TECNICO -**

Il sottoscritto architetto Piero Migliaccio, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Napoli al n° 5878, con studio professionale in Napoli alla via Sant'Anna dei Lombardi n° 44, su incarico ricevuto dalla "DI GENNARO S.P.A." - p. IVA: 01619050634 - con sede in Napoli, in riferimento all'immobile ubicato in CAIVANO (NA) LOCALITA' PASCAROLA (in Catasto Fabbricati: FOGLIO - 10 -, p.la - 363 -, sub. - 1 -, avendo ricevuto incarico di verificare lo stato generale delle pavimentazioni relative alle aree che sono state oggetto della presenza di rifiuti combustibili, in conseguenza dell'incendio avvenuto in data 25.07.2018 ed in riscontro al VERBALE ARPAC N° 18/RO/19 DEL 06.06.2019,

PREMESSO

- che la società "Di Gennaro S.P.A.", a seguito dei danni connessi all'incendio sviluppatosi in data 25.07.2018 e delle consequenziali prescrizioni delle Competenti Autorità ha avviato tutte le operazioni utili al ripristino della funzionalità dell'impianto;
- che, nello specifico, si è provveduto in via preliminare alla compartimentazione delle aree interessate dall'incendio, mediante la realizzazione di una barriera lineare costituita da new-jersey;
- che successivamente si provveduto a sgombrare il piazzale su cui erano presenti i rifiuti combustibili, come indicato nella successiva immagine;



Foto n° 1 - il piazzale sgombrato dai "combustibili" al 03.06.2019

CORBO BENI IMMOBILI S.R.L.
Corso Lucilio 176
81037 Sessa Aurunca (CE)
P. Iva: 03245400613

[Handwritten signature in blue ink]
Architetto Delegato



VERIFICATO

- che le sopra descritte aree, meglio individuate nel grafico sotto riportato (grafico n° 1) e nella foto aerea n° 1, risultano di fatto essere state oggetto di "ammaloramento" e degrado del calcestruzzo per sviluppo di fiamme e calore;
- che le relative pavimentazioni, dai sopralluoghi effettuati, sono apparse essere state danneggiate solo per uno strato superficiale e, in maniera principale, per le aree schematicamente indicate nel grafico n° 1;

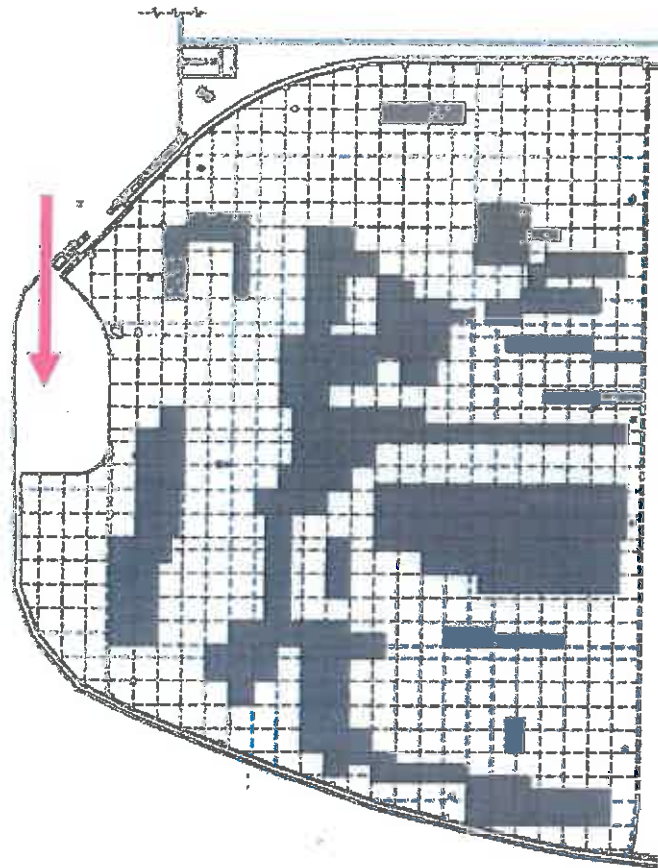


Grafico n° 1 - le aree del piazzale principalmente danneggiate

- che si è provveduto a **verificare lo stato delle pavimentazioni constatando che le aree in cui risulta essere stata danneggiata la pavimentazione per spessori superiori a cm 5 ammontano a circa il 40% della superficie totale, per circa complessivi mq 3.800,00;**
- che, in funzione del contratto stipulato in data 11.06.2019 con la ditta "Corbo Beni Immobili S.r.l.", in qualità di Direttore dei Lavori si è provveduto a

CORBO BENI IMMOBILI S.R.L.
Corso Lucio 176
81037 Sessa Aurunca (CE)
P. Iva: 03245400613

[Handwritten signature in blue ink]
L'Amministratore Delegato



ripristinare la funzionalità del paizzale attraverso gli Interventi di seguito indicati:

- *fresatura della pavimentazione per le aree fortemente "ammalorate"*
 - *realizzazione perfori e relativi inghisaggi di ferri sul perimetro delle zone della pavimentazione fresata*
 - *lavaggio delle aree fresate con idropultrice*
 - *ripristino della pavimentazione con getto in calcestruzzo tipo "Rck 35 xd2 S5"*
- che l'andamento dei lavori è stato documentato nei singoli e puntuali RAPPORTI DI CANTIERE (si veda allegato n° 2);
- che l'ultimo getto della pavimentazione è stato eseguito in data 10.17.2019;
- che i lavori sono stati completati in data 13.07.2019, procedendo alle opere di raccordo/ripristino tra la pavimentazione nuova e vecchia;
- che le superfici di pavimentazione eseguite a consuntivo ammontano a complessivi mq 3.830,00;
- che sono state eseguite ulteriori opere accessorie (pulizia caditoie, ripristino pozzetti, etc.) come desumibile dai citati RAPPORTI DI CANTIERE, che saranno oggetto di contabilizzazione extra contratto;

COLLAUDA

- per quanto di propria competenza, l'esecuzione delle opere di rifacimento della PAVIMENTAZIONE INDUSTRIALE afferenti all'area ingombra dai combustiti;

ATTESTA

- per quanto di propria competenza, l'ottemperanza alle prescrizioni di cui al verbale ARPAC N° 18/RO/19 DEL 06.06.2019, in relazione al "ripristino della pavimentazione ammalarata" per le aree occupate dai combustiti;
- l'assenza di vizi e/o difetti nelle opere eseguite, confermando per le stesse l'esecuzione a regola d'arte, secondo le previsioni progettuali e gli accordi contrattuali;

Napoli, 15.07.2019



CORBO BENI IMMOBILI S.R.L.

Corso Lucilio 176
81037 Sessa Aurunca (CE)

Pr. Im. 03245400613

- A1) verbale ARPAC N° 18/RO/19 DEL 06.06.2019

- A2) estratto dei rapporti di cantiere dal 13.06.2019 al 10.07.2019



Il Committente
L'Amministratore Delegato

Verbale 18/RO/19

Oggetto: richiesta intervento di sopralluogo congiunto della Regione Carabinieri Forestale Campania – NIPAAF di Napoli - per attività delegata dall'A.G. sulla ditta Di Gennaro S.p.a sita nel Comune di Caivano in località Pascaroia zona ASI.

In seguito alla richiesta citata in oggetto, il giorno 6 del mese di giugno dell'anno 2019 i sottoscritti tecnici dott. Renato Olivares e dott. Gianfranco Tedesco dell'ARPAC, Dipartimento Provinciale di Napoli, sono intervenuti presso la località di cui all'oggetto, dove erano già presenti il Magg. Rosa Codella e il Brig capo Giovanni Fasano della P.G. richiedente, per effettuare un sopralluogo sulla società de qua al fine di verificare l'adempimento delle prescrizioni fatte da ARPAC fin dalla data dell'incendio avvenuto il 25/07/18 ivi compresi i verbali ARPAC n. 57/RO/18 del 21/09/18 e n. 77/RO/18 del 05/12/18.

All'atto del sopralluogo sono presenti l'amministratore delegato Sig. Giuseppe Di Gennaro e la dott.ssa Lucia Borriello in qualità di assistente della direzione della società.

Si è provveduto ad una ispezione dei luoghi oggetto di prescrizioni verificando quanto segue:

- il piazzale ove erano presenti i rifiuti combustibili risulta completamente sgombrato dagli stessi, così come anche avvertito dalla comunicazione fatta agli Enti ed alla Procura;
- la pavimentazione sottostante i rifiuti di cui al precedente punto, risulta in più punti ammalorata;
- il depuratore posto a servizio di tale area risulta fermo;
- le vasche a servizio del depuratore delle acque di piazzale sono state utilizzate per lo stoccaggio temporaneo delle stesse; pertanto si chiede ai rappresentanti dell'azienda di fornire la IV copia dei F.I.R. fin dal primo smaltimento effettuato di tali reflui;
- è stata ispezionata l'area individuata nella relazione tecnica delle Indagini Preliminari del Novembre 2018 (prodotta dalla "ECOSISTEM" ed assunta al protocollo di ARPAC con il n°65107/2018) come "Area B", per la quale viene consegnata agli scriventi la documentazione relativa al collaudo della pavimentazione.

In merito alle prescrizioni ARPAC si rappresenta che la Di Gennaro S.P.A. ha prodotto a codesto Ente in data 05/04/2019 il Rapporto di Caratterizzazione conclusivo redatto ai sensi della D.G.R. n°417/2016, relativo all'intero opificio.

Viene acquisito in sede di sopralluogo il verbale di collaudo tecnico della realizzazione della pavimentazione dell'Area B e relativi allegati, nonché i rilievi fotografici del 03/06/2019.

Di tutta la documentazione di cui ai punti precedenti, l'ARPAC si riserva di esaminarla e redigere apposito parere.

Infine, per quanto constatato in fase di sopralluogo odierno, si prescrive:

- a) il ripristino della pavimentazione ammalorata e relativo collaudo finale;
- b) il ripristino della funzionalità dell'impianto di depurazione delle acque di piazzale;
- c) di fornire la IV copia dei F.I.R. con relative analisi, di avvenuto smaltimento dei reflui presenti nelle vasche a servizio dell'impianto di cui sopra e di quelli eventualmente già smaltiti.

Copia del presente verbale viene rilasciata alla P.G. richiedente per il seguito di competenza.

I TECNICI ARPAC

Renato Olivares
Gianfranco Tedesco

REGIONE CARABINIERI FORESTALE CATANIA
GRUPPO DI NAPOLI
N.I.P.A.A.F.

APP. Sc. MATRONS 3.

IL NUCLO IN INTERSTAZIONE
ESTRIPEDICATO PER LA DISPOSIZIONE USUALE DA PARTE DEL P.M. sotto
RA. BOBBIOLA LUCIA

DELLA STESSA

DIREZIONE DEL D. DI CANTARO

GIUSEPPE


Per favore nota

A QUESTA PC

07.06.19

15³⁰

NUMERI DE UFFICI NUCLO





**CORBO BENI
IMMOBILI SRL**

RAPPORTO DI CANTIERE

18/06/2019

Cantiere : DI GENNAIO SPA Calvano 4° Lotto
Ripristino pavimentazione piazzale Area Combusti

Contratto del 11/06/2019

Sole

CONDIZIONI
METEO

PERSONALE PRESENTE

n°	nome	matr.	ore	mezzo
1	Corbo Franco		8	Fiat Ducato
2	Ruotolo Vichelo		8	MiniPala Swaz210
3	Gavriluta Ovidio		8	Bobcat 763 con scopa
4	Mabano Vichelo		8	Iveco 190-36
5	Penna Franco		8	Idropulitrice 380v
6				compressore 100lit 220v
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

MEZZI ADOPERATI

n°	mezzo	ore
	Fiat Ducato	
	MiniPala Swaz210	
	Bobcat 763 con scopa	
	Iveco 190-36	
	Idropulitrice 380v	
	compressore 100lit 220v	

LAVORI ESEGUITI: Pulizia parti della pavimentazione fresata;
Realizzazione perfori e rebolvi inghisaggi di ferri sul perimetro delle zone della
pavimentazione fresata;
Lavaggio con idropulitrice delle zone della pavimentazione fresata

LAVORI ESEGUITI

QUANTIFICAZIONE

ANNOTAZIONI/DESCRIZIONE

TEMPI

PARTENZA: 07:40
ARRIVO IN CANTIERE: 07:30
FINE LAVORO: 17:00
RIENTRO: 17:30

ENTRATA MATERIALI

D.d.T.	descrizione	U.M.	quantità	fornitore	trasp.	a cura	D.d.T.	descrizione	U.M.	quantità	fornitore	trasp.	a cura
	Ferro in barre diam 8	kg	520,00	Lampitelli									
	Resina per inghisaggi	n	4,00	Lampitelli									
	cemento 3,25	sc	10,00	Lampitelli									
	Aggrappante Betonlip	n	10,00	MAS edilizia									

FOTO DEL CANTIERE





**CORBO BENI
IMMOBILI SRL**

RAPPORTO DI CANTIERE

19/06/2019

Cantiere : Di Giarano SPA Calvano 4° Lotto
Ripristino pavimentazione piazzale Area Combusti

Contratto del 11/06/2019

**CONDIZIONI
METEO**

Sole

PERSONALE PRESENTE

MEZZI ADOPERATI

ore

Straord.

Fiat Ducato

MiniMpa Sw3210

Bobcat 763 con scopa

Idropulitrice 380v

LAVORI ESEGUITI
LAVORI ESEGUITI: Pulizia parti della pavimentazione fresata;
Realizzazione perfori e relativi Inghisaggi di ferri sul perimetro delle zone della
pavimentazione fresata;
Lavaggio con idropulitrice delle zone della pavimentazione fresata

ASSOCIAZIONI/ DESCRIZIONE

QUANTITATIVE

TEMPI

1. Corbo Franco 8

2. Ruotolo Michele 8

3. Gavriluta Ovidio 8

4. Matano Michele 8

5. Penna Franco 8

6. 8

7. 8

8. 8

9. 8

10. 8

11. 8

12. 8

13. 8

14. 8

15. 8

16. 8

PARTENZA: 05:20

ARRIVO IN CANTIERE: 06:00

FINE LAVORO: 14:00

RIENTRO: 14:40

ENTRATA MATERIALI

D.d.T.	descrizione	U.M.	quantità	fornitore	trasp. a cura	D.d.T.	descrizione	U.M.	quantità	fornitore	trasp. a cura
	Resina per Inghisaggi	n	7,00	Wurth							
	Resina per Inghisaggi	n	5,00	Lampitelli							

FOTO DEL CANTIERE





**CORBO BENI
IMMOBILIARI SRL**

Cantiere : Di Gennaro SPA Caivano 4° Lotto
Ripristino pavimentazione piazzale Area Combust

RAPPORTO DI CANTIERE

20/06/2019

Contratto del 11/06/2019

CONDIZIONI
METEO

Sole

PERSONALE PRESENTE

Straord.

MEZZI ADOPERATI

LAVORI ESEGUITI

n°	nominativo	ore
1	Corbo Franco	8
2	Ruotolo Michele	8
3	Gavriluta Ovidio	8
4	Malano Michele	8
5	Penna Franco	8
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		

Fiat Ducato
Minipala Sw3210
Idropulitrice 380v

LAVORI ESEGUITI: Pulizia parti della pavimentazione fresata;
Realizzazione periferi e relativi inghiaggi di ferra sul perimetro delle zone della
pavimentazione fresata;
Lavaggio con idropulitrice delle zone della pavimentazione fresata

GUASTI/ANORMALI

ANNOTAZIONI/DESCRIZIONE

TEMPI

PARTENZA: 05:20

ARRIVO IN CANTIERE: 06:00

FINE LAVORO: 14:00

RIENTRO: 14:40

ENTRATA MATERIALI

D.d.T.	descrizione	U.M.	quantità	fornitore	trasp. a cura	D.d.T.	descrizione	U.M.	quantità	fornitore	trasp. a cura
	Resina per inghiaggi	n	7,00	Wurth							
	Dischi da taglio	n	5,00	Lampitelli							

[Handwritten signature]

FOTO DEL CANTIERE





**CORBO BENI
IMMOBILI SRL**

Cantiere : Di Gennaro SPA Calvrano 4° Lotto
Ripristino pavimentazione piazzala Area Combusti

RAPPORTO DI CANTIERE

21/06/2019

Contratto del 11/06/2019

Sole

CONDIZIONI
METEO

MEZZI ADOPERATI

Fiat Ducato
Municipala Sw3210
Idropulitrice 380v

LAVORI ESEGUITI

LAVORI ESEGUITI: Pulizia parti della pavimentazione fressata;
Realizzazione perfori e relativi Inghisaggi di ferri sul perimetro delle zone della
pavimentazione fressata;
Lavaggio con idropulitrice delle zone della pavimentazione fressata

FOTO DEL CANTIERE

PERSONALE PRESENTE

n°	nominativo	ore	Straord.
1	Corbo Franco		
2	Ruotolo Michele	8	
3	Gavrilluta Ovidio	8	
4	Matano Michele	8	
5	Penna Franco	8	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

TEMPI

PARTENZA: 05:20
ARRIVO IN CANTIERE: 06:00
FINE LAVORO: 14:00
RIENTRO: 14:40

GUASTI/ANOMALIE

ANNOTAZIONI/DESCRIZIONE

ENTRATA MATERIALI

D.d.T.	descrizione	U.M.	quantità	fornitore	trasp. a cura	D.d.T.	descrizione	U.M.	quantità	fornitore	trasp. a cura



**CORBO BENI
IMMOBILIARI SRL**

RAPPORTO DI CANTIERE

24/06/2019

Cantiere : Di Gianni SPA Calvano 4° Lotto
Ripristino pavimentazione piazzale Area Combust

Contratto del 13/06/2019

CONDIZIONI
METEO

Sole

PERSONALE PRESENTE		MEZZI ADOPERATI		LAVORI ESEGUITI
n°	nominativo	ore	Straord.	
1	Corbo Franco	8		LAVORI ESEGUITI: Pulizia parti della pavimentazione fresata; Realizzazione perfori e relativi inghissaggi di ferri sul perimetro delle zone della pavimentazione fresata; Lavaggio con idropulitrice delle zone della pavimentazione fresata; Getto in calcestruzzo pavimentazione esterna.
2	Ruotolo Michele	8		
3	Gavriluta Ovidio	8		
4	Matano Michele			
5	Penna Franco	8		
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

Fiat Ducato

Minipala Sw3210

Idropulitrice 380v

LAVORI ESEGUITI

LAVORI ESEGUITI: Pulizia parti della pavimentazione fresata;
Realizzazione perfori e relativi inghissaggi di ferri sul perimetro delle zone della
pavimentazione fresata;
Lavaggio con idropulitrice delle zone della pavimentazione fresata;
Getto in calcestruzzo pavimentazione esterna.

GUASTI/ANORMALIE

ANNOTAZIONI/DESCRIZIONE

TEMPI
PARTENZA: 05:20
ARRIVO IN CANTIERE: 06:00
FINE LAVORO: 14:00
RIENTRO: 14:10

ENTRATA MATERIALI

D.d.I.	descrizione	U.M.	quantità	fornitore	trasp. a cura	D.d.I.	descrizione	U.M.	quantità	fornitore	trasp. a cura
	Rck 30 S5 xc2	mc	18,00	CalBit							
	Resina	n°	24,00	Wurth							

FOTO DEL CANTIERE



RAPPORTO DI CANTIERE

28/06/2019

Contratto del 11/06/2019

Sole

CONDIZIONI
METEO

Cantiere : DI 6 annaro SPA Calvano 4° Lotto
Ripristino pavimentazione piazzale Area Combusti

PERSONALE PRESENTE		MZZA ADORATI	LAVORI ESEGUITI
n°	nominativo	ora	
1	Corbo Franco		LAVORI ESEGUITI: Getti per ripristino pavimentazione, il primo effettuato in mattinata ed il secondo nel pomeriggio, la squadra di pavimentisti ha lasciato il cantiere alle 22,00; Montaggio spazzole per scopa bobcat; Lavaggio con idropulitrice e posa primer di adesione
2	Rucolo Michele		
3	Gavriluta Ovidio	8+3	
4	Malano Michele	8+3	
5	Penna Franco		
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

PERSONALE PRESENTE		MZZA ADORATI	LAVORI ESEGUITI
n°	nominativo	ora	
1	Corbo Franco		LAVORI ESEGUITI: Getti per ripristino pavimentazione, il primo effettuato in mattinata ed il secondo nel pomeriggio, la squadra di pavimentisti ha lasciato il cantiere alle 22,00; Montaggio spazzole per scopa bobcat; Lavaggio con idropulitrice e posa primer di adesione
2	Rucolo Michele		
3	Gavriluta Ovidio	8+3	
4	Malano Michele	8+3	
5	Penna Franco		
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

TEMPI	
PARTENZA:	05:20
ARRIVO IN CANTIERE:	06:00
FINE LAVORO:	18:00
RIENTRO:	18:40

D.d.T.	descrizione	U.M.	quantità	fornitore	trasp. a cura	D.d.T.	descrizione	U.M.	quantità	fornitore	trasp. a cura
5185/19	CLS RCK30	MC	11,00	CALBIT							
5255/19	CLS RCK30	MC	12,00	CALBIT							

FOTO DEL CANTIERE






**CORBO BENI
IMMOBILIARI SRL**

Cantiere : DI GENNARO SPA Caivano 4° Lotto
Ripristino pavimentazione piazzale Area Combusti

RAPPORTO DI CANTIERE

29/06/2019

PERSONALE PRESENTE

n°	nome/iniziale	ore	straord.
1	Corbo Franco		
2	Ruotolo Michele		
3	Gavriluta Ovidio	8	
4	Matano Michele		
5	Penna Franco		
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

TEMPI
 PARTENZA: 08:20
 ARRIVO IN CANTIERE: 06:00
 FINE LAVORO: 14:00
 RIENTRO: 14:40

Contratto del 11/06/2019

MEZZI ADOPERATI

Fiat Punto	Minipala Sw3210	Idropulitrice 380v

CONDIZIONI METEO

Sole

LAVORI ESEGUITI

LAVORI ESEGUITI: Getto per ripristino pavimentazione;
 Pulizie con scopa materiale fessato;
 Lavaggio con idropulitrice e posa primer di adesione

ANNOTAZIONI/DESCRIZIONE

GUASTI/ANOMALIE
 Bucata ruota Minipala Sw3210

ENTRATA MATERIALI

D.d.T.	descrizione	U.M.	quantità	fornitore	trasp. a cura	D.d.T.	descrizione	U.M.	quantità	fornitore	trasp. a cura
5/28/19	ds rck30	mc	10,00	CALBIT							

FOTO DEL CANTIERE





**CORBO BENI
IMMOBILIARI SRL**

Cantiere : DI Gianni SPA Caivano 4° Lotto
Ripristino pavimentazione piazzale Area Combusti

RAPPORTO DI CANTIERE

01/07/2019

Contratto del 11/06/2019

CONDIZIONI
METEO Sole

PERSONALE PRESENTE

n°	nominativo	ore	Straord.	Mezzi adoperati
1	Corbo Franco			Fiat Ducato
2	Ruotolo Michele			Minipala Sw3210
3	Gavrilita Ovidio	8		
4	Maiano Michele	8		
5	Penna Franco			
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

LAVORI ESEGUITI:

Pulizia con scopa materiale freato;
Fort ed inghisaggi armature,

MEZZI ADOPERATI

LAVORI ESEGUITI

GUASTI/ANOMALIE

ANNOTAZIONI/DESCRIZIONE

TEMPI

PARTENZA: 08:20
ARRIVO IN CANTIERE: 06:00
FINE LAVORO: 14:00
REINTRO: 14:40

ENTRATA MATERIALI

D.d.T.	descrizione	U.M.	quantità	fornitore	trasp. a cura	D.d.T.	descrizione	U.M.	quantità	fornitore	trasp. a cura

FOTO DEL CANTIERE



**CORBO BENI
IMMOBILIARI SRL**

RAPPORTO DI CANTIERE

02/07/2019

Cantiere : Di Gemmano SPA Calvano 4° Lotto
Ripristino pavimentazione piazzale Area Combusti

Contratto del 11/06/2019

CONDIZIONI
METEO

Sole

PERSONALE PRESENTE

n°	nominativo	ore	Standard
1	Corbo Franco		Fiat Ducato
2	Ruotolo Michele		Minipala Sw210
3	Gavriluta Ovidio	8	
4	Matano Michele	8	
5	Penna Franco		
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

LAVORI ESEGUITI: Getto per ripristino pavimentazione
Pulizia con scopa materiale fessato;
Forti ed inghisaggi armature,

CONDIZIONI METEO

Sole

TEMPI

PARTENZA: 05:20

ARRIVO IN CANTIERE: 06:00

FINE LAVORO: 14:00

RIENTRO: 14:40

D.d.T.	descrizione	U.M.	quantità	fornitore	trasp. a cura	D.d.T.	descrizione	U.M.	quantità	fornitore	trasp. a cura
5382/19	calcestruzzo rck 30	mc	12,00	CALBITT srl							
5391/19	calcestruzzo rck 30	mc	10,00	CALBITT srl							
2923/19	Piancrete	Kg	25,00	Lampitelli Edilizia							

FOTO DEL CANTIERE





**CORBO BENI
IMMOBILIARI SRL**

Cantiere : DI Gennaro SPA Caivano 4° Lotto
Ripristino pavimentazione piazzale Area Combusti

RAPPORTO DI CANTIERE

03/07/2019

Contratto del 11/06/2019

Sole

CONDIZIONI
METEO

PERSONALE PRESENTE

n°	nominativo	ore	Straord.
1	Corbo Franco		
2	Ruotolo Michele		
3	Gavriliuta Ovidio	8	
4	Matano Michele		
5	Penna Franco		
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

MEZZI ADOPERATI

Fiat Ducato
Mimpala Sw3210

LAVORI ESEGUITI

LAVORI ESEGUITI: Pulizia con scopa materiale fessato;
Fori ed inghisaggi armature,

GUASTI/ANOMALIE

ANNOTAZIONI/DESCRIZIONE

TEMPI

PARTENZA: 05:20

ARRIVO IN CANTIERE: 06:00

FINE LAVORO: 14:00

RIENTRO: 14:40

ENTRATA MATERIALI

D.d.T.	descrizione	U.M.	quantità	fornitore	trasp. a cura	D.d.T.	descrizione	U.M.	quantità	fornitore	trasp. a cura

FOTO DEL CANTIERE



**CORBO BENI
IMMOBILIARI SRL**

RAPPORTO DI CANTIERE

08/07/2019

Cantiere : Di Gennaro SPA Calvano 4° Lotto
Ripristino pavimentazione piazzale Area Combustibili

Contratto del 11/06/2019

Sole

CONDIZIONI
METEO

PERSONALE PRESENTE

MEZZI/ABBIIGLIANTI

LAVORI ESEGUITI

Straord. Fiat Ducato

LAVORI ESEGUITI:
Lavaggio con idropulitrice zone fresate;
Posa primer, getto calcestruzzo per ripristino pavimentazione (ditta Epoxy System).

n° nominativo ore

1 Corbo Franco

2 Ruotolo Michele

3 Gavriluta Ovidio 8

4 Matano Michele

5 Penna Franco

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

TEMPI

PARTENZA: 05:20

ARRIVO IN CANTIERE: 06:00

FINE LAVORO: 14:00

RIENTRO: 14:40

QUANTITÀ/NOVALE

MEZZI/ABBIIGLIANTI

LAVORI ESEGUITI

D.d.T. descrizione U.N. quantità fornitore D.d.T. descrizione U.N. quantità fornitore trasport. a cura

5786/19 calcestruzzo RCK30 mc 11,00 CALBIT

5787/19 calcestruzzo RCK30 mc 11,00 CALBIT

5806/19 calcestruzzo RCK30 mc 11,00 CALBIT

3059/19 Piancrete 25kg kg 25,00 Lampitelli srl

FOTO DEL CANTIERE





**CORBO BENI
IMMOBILIARI SRL**

Cantiere : Di Gennaio SPA Calvano 4° Lotto
Ripristino pavimentazione piazzale Area Combusti

RAPPORTO DI CANTIERE

09/07/2019

Contratto del 11/06/2019

CONDIZIONI
METEO

Sole

PERSONALE PRESENTE

MEZZI ADOPERATI

n°	nome	inattivo	ore	Straord.	Fiat Ducato
1	Corbo Franco				
2	Ruotolo Michele		8		
3	Gavriluta Ovidio		8		
4	Matano Michele		8		
5	Penna Franco				
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

LAVORI ESEGUITI
LAVORI ESEGUITI: Lavaggio con idropulitrice zone fresate;
Posa primer, getto calcestruzzo per ripristino pavimentazione (ditta Epoxy System).
Ripristini superficiali con Betonfix Fluid

GUASTI/ANOMALIE

ANNOTAZIONI/DESCRIZIONE

TEMPI

PARTENZA: 05:20

ARRIVO IN CANTIERE: 06:00

FINE LAVORO: 14:00

RIENTRO: 14:40

ENTRATA MATERIALI

D.d.T.	descrizione	U.M.	quantità	fornitore	trasp. a cura	D.d.T.	descrizione	U.M.	quantità	fornitore	trasp. a cura
5901/19	calcestruzzo RCK30	mc	9,00	CALBIT							
5902/19	calcestruzzo RCK30	mc	11,00	CALBIT							
5908/19	calcestruzzo RCK30	mc	11,00	CALBIT							

FOTO DEL CANTIERE



[Handwritten signature]

CORBO BENI IMMOBILI SRL		RAPPORTO DI CANTIERE		10/07/2019					
Cantiere : Di Camaro SPA Calvano 4° Lotto Ripristino pa: Immatrazione piazzale Area Combustivi		Contratto del 11/06/2019	CONDIZIONI METEO	Sole					
PERSONALE PRESENTE		LAVORI ESEGUITI							
n°	nominativo	ore	Mezzi Adoperati	LAVORI ESEGUITI					
1	Corbo Franco		Fiat Ducato	LAVORI ESEGUITI: Lavaggio con idropulitrice zone fresate; Posa primer, getto calcestruzzo per ripristino pavimentazione (ditta Epoxy System). Ripristini superficiali con Betonfip Fluid; Caricato camion (con pala Di Gemmaro) materiale risulta.					
2	Ruotolo Michele	8							
3	Gavriliuta Ovidio	8							
4	Matano Michele	8							
5	Penna Franco								
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
MEZZI ADOPERATI		ANNOTAZIONI/DESCRIZIONE							
QUANTITÀ/MATERIE		ENTRATA MATERIALI							
PARTENZA: 05:20									
ARRIVO IN CANTIERE: 06:00									
FINE LAVORO: 14:00									
RIENTRO: 14:40									
D.d.T.	descrizione	U.M.	quantità	fornitore	trasp. a cura	U.M.	quantità	fornitore	trasp. a cura
6002/19	calcestruzzo RC/30	mc	11,00	CALBIT					
6003/19	calcestruzzo RC/30	mc	11,00	CALBIT					
6005/19	calcestruzzo RC/30	mc	11,00	CALBIT					

FOTO DEL CANTIERE





CORBO BENI IMMOBILIARI SRL

RAPPORTO DI CANTIERE

11/07/2019

Cantiere : Di Gennaro SPA Caivano 4° Lotto
Ripristino pavimentazione piazzale Area Combust

Contratto del 11/06/2019

CONDIZIONI METEO

Sole

PERSONALE PRESENTE

n°	nom.ativo	ore	Straord.	Fiat Ducato
1	Corbo Franco			
2	Ruotolo Michele	8		
3	Gavilluta Ovidio	8		
4	Malano Michele	8		
5	Penna Franco			
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

LAVORI ESEGUITI

LAVORI ESEGUITI: Lavaggio con idropulitrice macchie pavimentazione; pulizia con scopa
Posa primer, Ripristini superficiali con Betomtp Fluid; Montaggio cordoli marciapiede

MEZZI ADOPERATI

Fiat Ducato

QUANTITÀ / VALORE / DESCRIZIONE

TEMPI

PARTENZA: 06:30
ARRIVO IN CANTIERE: 07:30
FINE LAVORO: 17:00
RIENTRO: 17:40

D.d.T.	descrizione	U.M.	quantità	fornitore	trasp. a cura	D.d.T.	descrizione	U.M.	quantità	fornitore	trasp. a cura

FOTO DEL CANTIERE

